
『제주 AX 대전환 인재양성 프로그램 운영』 (가칭) 제안서

2026. 8.



주식회사 위니브

목 차



I . 제안 개요

1. 제안 목적 및 동기	1
2. 제안의 특징 및 장점	6
3. 기대효과	7

II . 제안사 소개

1. 회사 개요	9
2. 사업수행실적	11
3. 경영상태	13
4. 조직 및 인력현황	13

III . 사업수행계획

1. 사업수행전략	16
2. 사업관리계획	25
3. 인력운영계획	29

IV . 기타 (추가 제안)

1. 무상 부가 제안	32
2. 사업 연속성 지원	32
3. 영문 약어표	32

1. 제안 목적 및 동기

사업명	「제주 AX 대전환 인재양성 프로그램 운영」(가칭) 용역
용역기간	계약일 ~ 2026. 12. 18.
과업범위	① AI 강사 양성(초급 60·전문 60) ② 학생 1,200명·학부모 240명 교육 ③ 제주 바이브 코딩 챌린지(300명 내외) ④ 교육과정·교재·VOD 개발 ⑤ 온라인 교육 플랫폼 운영 ⑥ 교육용 AI 계정 1,560명 제공

1.1 사업 배경 및 필요성에 대한 이해

가. 코딩의 문법에서 문제 정의로, 다시 ‘일하는 AI’로: 인재상의 전환

- (패러다임 전환) 생성형 AI와 자연어 기반 개발(바이브 코딩)의 확산으로, 디지털 인재의 핵심 역량은 프로그래밍 문법 숙달에서 "문제를 정의하고 AI로 해결하는 역량"으로 이동하였음
- (산출물 중심) 본 사업이 요구하는 ‘1인 1AI 앱’ 개발은 이 전환을 가장 직접적으로 체득하는 방식이며, 단순 체험형 교육으로는 달성할 수 없는 산출물 중심 성취를 전제로 함
- (자동화로의 확장) 생성형 AI의 활용 단계는 ① 대화형 질의응답(문고 답을 얻는 단계) → ② Agent형 AI에 업무 자체를 위임(맡기고 결과를 받는 단계)으로 이동하고 있으며, 현재 산업 현장이 요구하는 지점은 ②단계임. 질의응답 수준의 활용만으로는 이 수요를 충족할 수 없고, ‘실제로 일을 수행하는 AI를 직접 만들어 쓰는 역량’이 핵심 인재상으로 이동하였음
- (제작으로의 확장) 한편 자연어 기반 코드 생성(바이브 코딩)은 활용 단계의 중간 단계가 아니라, AI에게 위임하여 받아 낸 결과물에 해당함. 즉 이는 활용 심화와는 별개의 축인 ‘필요한 앱·서비스를 직접 만들어 내는 역량’으로 분류되어야 하며, 개발 비전공자도 자신의 문제만 정의할 수 있으면 필요한 앱을 스스로 만들 수 있는 시대가 되었음
- (본 사업의 해석) 따라서 제안사는 본 과업의 산출물을 ‘작동하는 앱 1종’에 한정하지 않고, 위 두 축을 그대로 옮긴 ‘1인 1AI Agent’(업무를 위임) + ‘1인 1AI 앱’(필요한 것을 제작)으로 설계함. 학습자는 자신의 반복 업무·학습 과제를 정의하고, 이를 대신 수행하는 AI Agent를 직접 만들어 업무 시간 절감을 체감하는 동시에, 필요한 서비스를 앱으로 완성하는 경험을 함께 축적함

나. 제주가 직면한 네 가지 과제

- (지식격차) 산업 현장은 이미 **Agent형 AI에게 업무를 맡기는 단계**로 이동하였으나, 도내 교육 현장에서 다루어지는 내용은 여전히 도구 소개·기초 활용 수준에 머물러 **최신 AI 지식과의 시차(時差)**가 누적되고 있음. 이는 강사·교재·실습 환경이 동시에 갱신되어야 해소되는 구조적 과제임
- (강사부족) 도내 AI 교육 수요 대비 최신의 지식을 습득한 검증된 지역 강사 풀이 부족하여, 교육 품질이 도외 강사 수급 상황에 좌우됨
- (도농격차) 읍·면 소외지역과 동(洞) 지역 간 교육 접근성 차이가 학생과 학부모 모두에게 누적되고 있음
- (성과단절) 교육이 일회성으로 끝나 교재·강사·산출물이 지역 자산으로 축적되지 않음

다. 본 과업의 위치: 선순환 생태계의 설계

- (구조이해) 본 과업은 ① **지역 강사 양성(120명)** → ② **초등학생~성인 교육(1,440명)** → ③ **성과 확산 행사(300명)**가 하나의 고리로 이어지는 구조를 요구함. 즉 개별 교육의 합이 아니라, **"제주가 키우고, 제주가 가르치는"** 자립 구조의 정착이 사업의 본질임
- (수행방향) 따라서 제안사는 각 과업을 분절적으로 수행하지 않고, 양성된 강사가 학생 교육에 실제 투입되고 그 산출물이 챌린지로 이어지도록 **단일 플랫폼 위에서 통합 운영**함
- (성과 연계) 전문강사 자격요건에 '**전년도 AX 대전환 인재양성 프로그램 수료자**'가 명시된 점을 고려하여, 해당 수료자가 확인되는 경우 금년 강사 풀·주강 후보로 우선 흡수하고, 금년 수료 체계는 차년도 자격요건에 그대로 연결되도록 표준화하여 **사업 간 성과 단절을 차단**함(IV-2 연계)

1.2 과업 목표 및 요구사항 이해

- (추진목표) 사업 기간 내 **지역 강사 120명 양성 → 초등학생~성인 1,440명 '1인 1AI 앱' 중심 교육 → 챌린지 300명 성과 확산**을 완수하고, 교재·VOD·플랫폼·강사풀을 지역 자산으로 남겨 **지역 주도 AI 교육 생태계의 기반을 완성**함
- (추진방향) 학습자의 목적이 서로 다르다는 점에 착안하여, 전 대상 과정을 **A트랙 (Agent형 AI 업무 자동화)**과 **B트랙(AI 활용 앱 제작)**의 **2개 트랙**으로 구성함. 공통 기초 과정을 이수한 뒤 목적에 맞는 트랙을 선택하며, 두 트랙 모두 동일한 LMS·교재 체계 위에서 운영함

구분	A트랙. Agent형 AI 업무 자동화	B트랙. AI 활용 앱 제작 (바이브 코딩)	공통
대상	반복 업무를 줄여 업무 혁신을 이루려는 그룹 (재직자·교사·행정 실무자·성인학습자)	원하는 웹·앱을 직접 만들려는 그룹 (학생·예비 창업자·1인 서비스 기획자)	전 대상
목표 역량	업무를 정의하고 AI에게 위임·자동화	문제를 정의하고 작동하는 서비스로 구현	문제 정의력·AI 윤리·정보보안
산출물	1인 1AI Agent (업무 자동화 시나리오 포함)	1인 1AI 앱 (배포 URL 포함)	산출물 LMS 등록·챌린지 출품

※ 과업 ①의 ‘초급·전문’ 구분은 수준의 축이고, A·B 트랙은 목적의 축으로 서로 교차 편성함(예: 전문 트랙 강사는 A·B 두 트랙의 지도 역량을 모두 이수함)

- (공통 추진원칙) ① 양성(Train)→투입(Deploy)→확산(Scale)의 선순환 구조로 전 과업을 통합 운영함 ② 자체 보유 플랫폼·교재·강사·행사 역량으로 하도급 없이 직접 수행함 ③ 소외지역 우선 편성으로 도농 격차 해소에 기여함 ④ 두 트랙 모두 **최신 AI 도구·기법을 분기 단위로 갱신**하여 지식 시차를 해소함
- (추진전략·추진체계) 자체 보유 자원 기반 직접 수행 전략과 단일 LMS 통합 추진 체계로 운영함(체계도 Ⅲ-1.1, 조직 Ⅲ-3.1)

120 명 강사 양성 (초급 60·전문 60)	1,200 명 학생 교육 (초·중·고 3트랙)	240 명 성인 교육 (학부모·도민)	300 명 바이브 코딩 챌린지
30 개 대상별 VOD 강의 (300여 개 영상)	12 종 대상별 교재 (웹 교안+PDF)	1,740 명 1인 1계정 AI 샌드박스	300 명 제주 AI 컨퍼런스 (연계 개최)

- (주요내용) 제안서는 과업지시서 Ⅱ-2의 세부과업 ①~⑥ 전 항목과 과업 일반지침(Ⅲ), 성과 보고(Ⅳ), 성과품 제출(Ⅴ) 요건을 모두 이행 대상으로 인식하고, 아래 매트릭스와 같이 본 제안서 각 절에 빠짐없이 대응시켰음

□ 정성평가 항목별 입증 위치

정성평가 항목(배점)	본 제안서 입증 내용	해당 장·절
1. 사업의 이해도 (15점)	사업 배경·목표의 재해석, 요구사항 전 항목 대응 매트릭스, 절차상 주요 Check Point 9종 사전 식별	I-1
2. 사업 수행 전략 (15점)	과업 ①~⑥ 통합 추진 체계, 과업별 세부 실행 방안, 학생 1,200명·학부모 240명 달성 세부 추진 방법, 강사 인증 평가 기준(안)	Ⅲ-1

정성평가 항목 (배점)	본 제안서 입증 내용	해당 장·절
3. 사업 관리 계획 (15점)	월별 추진 일정(예정공정표), 일정·의사소통·변경관리, 품질 관리, 사업기간 전·중·후 보안체계, 위험관리 8종, 산출물 검수·예산 집행 관리, 무상 부가 제안 5종	Ⅲ-2, Ⅳ
4. 인력운영계획 (15점)	수행 조직·업무분장, 투입인력 및 월별 투입 계획, 양성 강사 활용·배치 체계	Ⅲ-3

1.3 요구사항 ↔ 대응 매트릭스

과업지시서 요구사항	제안사 대응 방안	해당 절
① 강사 양성 (초급 60 / 전문 60)	공통 128h(16회차) + 전문 심화 32h(4회차) 하이브리드 운영, 마이크로 티칭·프로젝트 기반 인증 평가 의무화, 자격증 응시 지원	Ⅲ-1.2
② 학생 1,200명 '1인 1AI 앱'	학년군 4트랙(초·중·고·성인) 설계, 제주 생활 문제 해결형 수업, 고사양 자체 노트북·격리 실습망 투입, 개인별 앱 산출·포트폴리오 등록	Ⅲ-1.3
② 학부모 240명 소외지역 중심	읍·면 지역 권역 4개 + 제주시·서귀포시 핵심 권역 2개, 총 6개 권역 순회 '찾아가는 교육', 권역별 회차 계획(안)·미달 대응 제시, AI 시대 변화 이해부터 자녀의 미래 사회 준비까지 5단 구성	Ⅲ-1.3
③ 제주 바이브 코딩 챌린지(300명)	바이브 코딩 배틀·산출물 전시·체험존·컨퍼런스 4부 구성, 도내 해커톤 4건 직접 운영 경험 보유 자체 행사팀 투입, 훈격 확보 절차 착수 단계 개시	Ⅲ-1.4
④ 교육과정·교재 개발 (VOD 15차시 이상)	설계서 1종 + 대상별 교재 12종(웹+PDF), 자체 영상 스튜디오 제작 대상별 VOD 강의 30개(300여 개 영상)(초5·중7·고8·지도교사10, 요구 기준의 2배), AI·바이브 코딩 자체 출판 도서 17종을 베이스라인으로 활용	Ⅲ-1.5
⑤ 온라인 교육 플랫폼 구축·운영	자체 개발 LMS(위니버시티) 즉시 가동: 구축 기간·비용 없이 계약 직후 전용 클래스 개설, 자체 개발팀 상시 유지보수	Ⅲ-1.6
⑥ 교육용 AI 계정 1,560명	미성년자 이용 가능·Pro급 이상 모델·엔터프라이즈 보안 인증 요건을 모두 충족하는 서비스로 1인 1샌드박스 계정 1,740개 발급(요구 1,560명 + 챌린지 참가자 180명), 단일 대장 관리 및 종료 시 회수·파기	Ⅲ-1.7
양성 강사의 활용·배치계획 제시	수료 강사 인력풀 DB화 → 초등학생~성인 교육 주강·보조 배치 → 사업 종료 후 도내 파견 체계로 이관	Ⅲ-1.2 라.
성범죄·아동학대 전력 조회	모집 단계 필수 서류로 동의서 징구, 조회 완료자만 학생 교육 배치	Ⅲ-2.5
보고 체계 (착수·중간·최종, 주간보고)	착수 10일 이내, 중간 3개월 이내(9월), 최종 만료 10일 전 보고회 개최. 매주 수요일 17시 주간 공정보고에 실시간 대시보드 첨부	Ⅲ-2.1
보안 및 개인정보 보호	착수계와 함께 수급인·참여자 보안각서(자필) 제출, 미성년자 개인정보 최소수집·암호화·종료 시 파기	Ⅲ-2.5
성과품 제출 (보고서·자료 각 1식)	착수 5부·중간 5부·최종 10부(A4)+USB, 교육자료·운영자료·행사자료·만족도조사 각 1식 체크리스트 관리	Ⅲ-2.4

1.4 과업수행 절차상 주요 Check Point 및 핵심사항

- (경험기반) 유사 인력양성사업 15건의 경험을 토대로 본 과업의 절차상 관리 지점을 사전 식별하고 대응 방안을 수립하였음

단계	Check Point	제안사 관리 방안
착수 (계약~10일)	과업수행계획서(7일 이내)·현장 대리인 선정·착수계·예정공정표 (10일 이내)·수급인 및 참여자 전원 보안각서(자필)의 기한 내 제출	착수 체크리스트로 제출물·기한을 일괄 관리하고, 계약 즉시 착수보고회 일정을 발주처와 협의 확정함
모집·선발	강사 120명·학생 1,200명·학부모 240명 모집이 전체 일정의 선행 조건이며, 모집 지연은 곧 교육 일정 지연	목표 대비 200% 지원자 확보·150% 선발 파이프라인을 착수 즉시 가동하고, 학교 수요조사 공문을 착수 단계에 발송함
강사 검증	성범죄·아동학대 전력 조회 미완료 강사의 학생 교육 배치 불가	모집 단계에서 동의서를 필수 서류로 징구하고, 조회 완료자만 배치 대상 인력풀에 등록함
실습 환경	학교 PC·네트워크 의존 시 교사 양 앱 빌드 실습 불가	교사양 자체 노트북 및 자체 라우터 기반 격리망을 반입하여 학교 환경에 의존하지 않음
AI 계정	미성년자 이용·Pro급 이상·엔터프라이즈 보안 인증의 3개 요건을 동시 충족하는 서비스 선정	착수보고 시 요건 충족 근거(약관·인증서·요금제)를 제출하여 발주처 승인 후 발급을 개시함
중간보고	2026년 9월 내 과업 전체 1차 초안 보고(계약 후 3개월 이내 보고회)	교육과정 설계서·교재 초안·VOD 기획안을 8월 중 우선 완성하여 중간보고 대상 산출물을 확보함
챌린지 훈격	시상 훈격 확보는 기관 간 협의 소요 기간이 길어 지연 위험 존재	착수 단계부터 훈격 협의를 개시하고, 규정집·심사 기준을 사전 정비함
참여인력	낙찰 후 참여인력 임의 변경 불가	실제 투입 가능한 상근 인력만 제안하며, 부득이한 변경 시 사유 명기 후 사전승인 절차를 준수함
12월 집중	최종보고회(만료 10일 전)·챌린지 본행사·성과물 제출이 12월에 집중	최종보고서·성과물 초안을 11월 말까지 완성하는 것을 내부 기준으로 설정하여 기말 집중 리스크를 분산함

2. 제안의 특징 및 장점

제안사를 선택해야 하는 이유


본 과업의 핵심 방법론인 바이브 코딩을 이미 상품화하여 반복 운영하고 있고, 과업 ⑤가 요구하는 온라인 플랫폼을 자체 개발·보유하고 있으며, 과업 ④가 요구하는 교재를 직접 집필·출판하는 조직이 제주에 본사를 두고 상근함. 콘텐츠·플랫폼·강사·행사 운영을 모두 자체 보유하므로 외주 없이 일관된 품질을 내고, 도내 어디든 즉시 출동함

2.1 핵심 차별점 5가지

구분	제안사 강점 (검증 근거)	과업 연계
① 검증된 바이브 코딩 방법론	‘바이브 코딩 부트캠프’(4~7일 온라인)·‘바이브 사계 런케이션’(4박 5일 제주 오프라인)을 상설 프로그램으로 반복 운영. 기획→초안→기능→디자인→완성 5단계 자체 개발 프로세스 보유	과업 ①②③
② 자체 에듀테크 플랫폼 4종	위니버시티(LMS)·위니박스(웹 교안)·위니브 스페이스(메타버스 교육 공간)·위니브월드(실습 환경)를 자체 개발·운영. 과업 ⑤ 요구 기능 전부 기보유	과업 ④⑤
③ 제주 상주 전담 조직	제주 본사, 임직원 30명 상근. 강의실(80명)·영상 스튜디오·노트북 60대 자체 보유로 학교 방문형·소외지역 순회 교육 즉시 실행	과업 ②
④ 도내 ICT 행사 운영 역량	○○랩 챌린지 해커톤·○○권역 IS 해커톤·제주 AI 컨퍼런스·제주 코딩 베이스 캠프 등 도내 ICT 행사 다수 직접 기획·운영	과업 ③
⑤ Agent형 AI 업무 자동화 실현	인공지능 최고 책임자(CAIO)를 선임하고 AI Agent 기반 업무 자동화를 사내 표준으로 운영 중인 조직임. 제안·정산·교육 운영 문서를 Agent가 처리하는 실제 사례와 실패·복구 경험을 그대로 커리큘럼에 이식하여, ‘ 써 본 조직이 가르치는 자동화 ’를 제공함	과업 ①②③

2.2 이미 해본 곳이 가르치는 바이브 코딩

- (상품화 검증) 본 과업이 요구하는 바이브 코딩 교육은 제안사가 이미 유료 상품으로 반복 운영 중인 자체 프로그램임. 기수 운영으로 축적된 실패 사례·디버깅 패턴·프롬프트 템플릿을 커리큘럼에 이식하여 첫 기수부터 안정적 품질을 확보함
- (자체 교재) 제안사는 AI·바이브 코딩 전자책 17종을 직접 집필·출판하였으며 (Ⅱ-2.3), 이를 과업 ④ 교재 개발의 베이스라인으로 활용하여 개발 기간을 단축함
- (조직문화) 인공지능 최고 책임자(CAIO)를 선임하고 AI Agent 기반 업무 자동화를 사내 표준으로 적용하며, 사내 바이브 코딩 해커톤을 정례 운영함 **가르치는 조직이 먼저 쓰고 있음**

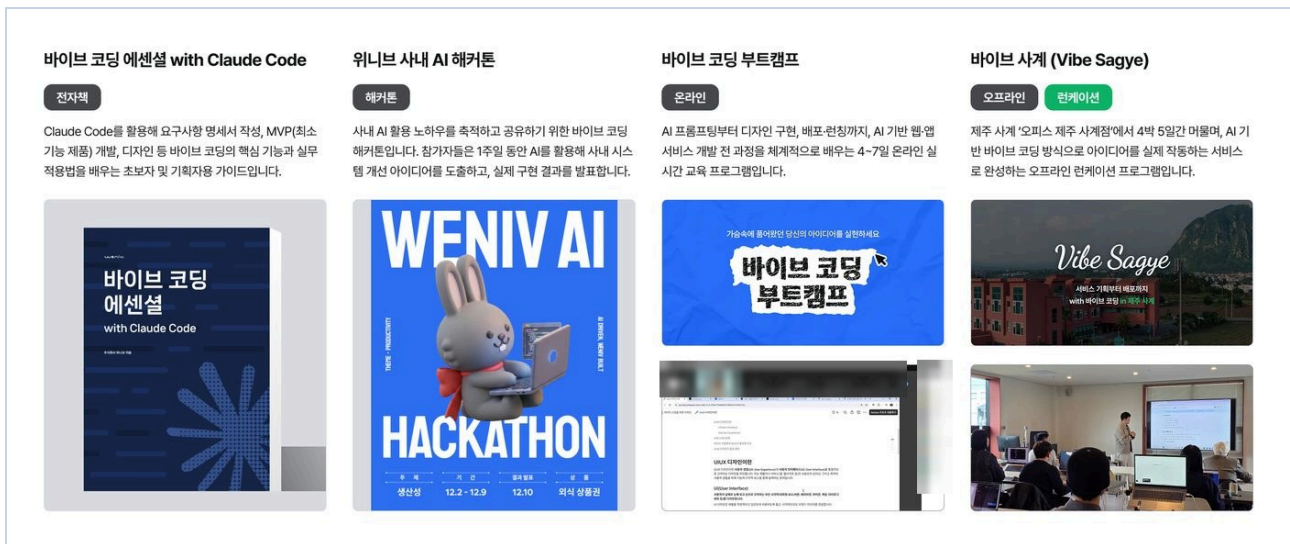

[그림 I -1] 제안사의 바이브 코딩 관련 출판 도서·사내 해커톤·상설 교육 프로그램

2.3 플랫폼 리스크 제로(Zero)

- (기보유 기능) 과업 ⑤의 요구 기능(VOD·실시간 강의·과제·진도 관리·Q&A)을 자체 LMS가 **전부 기보유**하므로 계약 직후 전용 클래스를 개설하고, 교육 개시일 이전에 준비를 완료하여 **구축 지연 리스크를 원천 제거**함
- (직접운영) 자체 개발팀이 직접 운영하므로 장애 발생 시 즉시 대응하며, 화면·리포트 커스터마이징도 사업 기간 중 수행함

2.4 소외지역까지, 제주 전역 커버리지

- (권역순회) 학부모 교육을 **읍·면 지역 권역 4개 + 제주시·서귀포시 핵심 권역 2개, 총 6개 권역**으로 나누어 순회 설계하며, 보유 노트북 60대와 추가 임차분으로 이동형 실습 교실을 구성하고 학교망과 분리된 격리 네트워크로 과업 ②의 ‘고사양 자체 노트북 및 격리 실습 환경’ 요건을 충족함

3. 기대효과

구분	기대효과	측정 지표
지역 인재	인증 평가를 통과한 AI 강사 풀 120명 확보·지속 활용	수료 120명 / 인력풀 DB 1식
청소년	도내 초·중·고 1,200명 ‘1인 1AI 앱’ 완성	개인별 앱 1,200건
디지털 격차 해소	소외지역 학부모 240명 AI 리터러시·생산성 향상	6개 권역 순회 / 240명
성과 확산	지역 문제 해결형 AI 문화 확산·공신력 제고	참가 300명 / 훈격 확보
지속가능성	교재·VOD·플랫폼·강사풀의 지역 자산화	교재 12종·VOD 강의 30개

구분	기대효과	측정 지표
업무 자동화	학습자·성인이 '실제 일을 수행하는 AI Agent'를 직접 제작·활용	AI Agent 산출물 1,200건

1. 회사 개요

1.1 일반현황

기업명	주식회사 위니브	대표자	이호준
설립일자	2020. 03. 11.	임직원수	30명(대표 포함)
사업자등록번호	000-00-00000	법인등록번호	*****-*****
소재지	제주특별자치도 제주시 ○○로 00, 0층 (제주 본사)		
홈페이지	https://www.weniv.co.kr/		
주요사업	소프트웨어 교육 및 컨설팅업, 직업능력개발훈련사업, 교육관련 자문 및 평가업 등		
비전	ICT 전문가로 성장하기 위해 필요한 모든 지식과 서비스를 제공하는 ICT 교육 콘텐츠 기업		


1.2 주요 성과 현황



[그림 II -1] 제안사 주요 성과 (온라인 강의·수강생·전자책 / ICT 행사 운영)

- (자체 콘텐츠) 약 6,000여 개(90여 개 강의)의 온라인 콘텐츠와 150여 권의 전자책을 자체 제작·출판하였으며, 인프런 수강생 10만 명 이상·평점 4.77/5로 품질이 외부 검증되었음(2026년 2월 기준)
- (AI 실무전환) 인공지능 최고 책임자(CAIO)를 선임하고, 생성형 AI·RAG·AI Agent 기반 실무형 커리큘럼을 직접 설계·운영함

1.3 자체 에듀테크 플랫폼 과업 ⑤ 대응

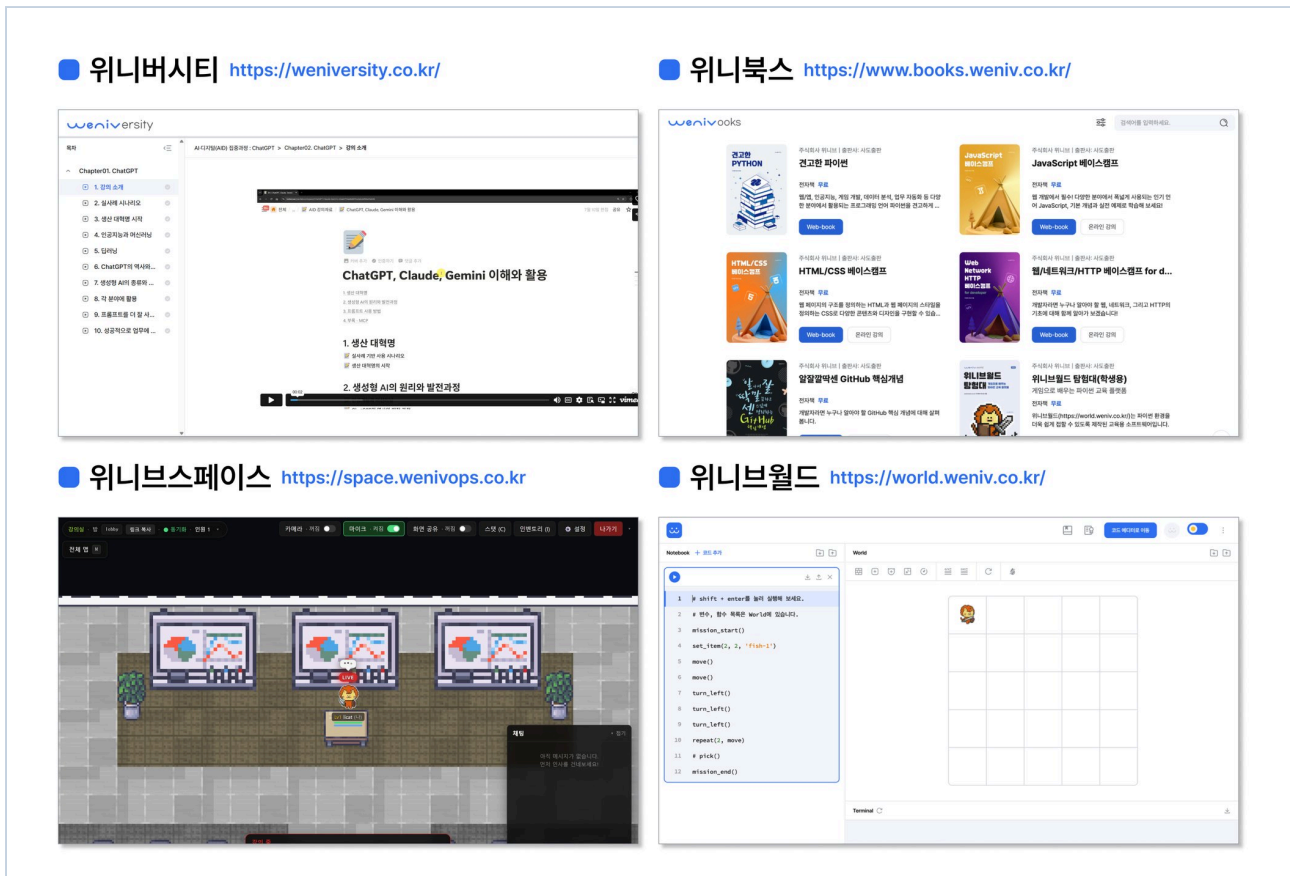

[그림 II -2] 자체 개발 플랫폼 실화면: 위니버시티(LMS)·위니북스(웹 교안)·위니브 스페이스(메타버스 교실)·위니브월드(실습)

플랫폼	주요 기능	본 과업 활용
위니버시티 (LMS)	VOD·실시간 강의, 과제 제출·첨삭 피드백, 출결·진도율·성취도 실시간 대시보드, 질의응답 게시판, 만족도·성취도 설문 자동화 , 정기 백업·개인정보 보호 조치	과업 ①~③ 전 교육생 학습관리, 발주처 실시간 대시보드 제공
위니북스 (웹 교안)	마크다운 기반 교안 웹 열람(설치 불필요), 코드 실행 환경 내장 , 마크다운 다운로드 생성형 AI 프롬프트 실습 병행, 모바일 반응형	과업 ④ 교재 12종 실시간 수정·배포
위니브 스페이스 (메타버스 교실)	메타버스 기반 2D 온라인 교육 공간 으로 아바타 실시간 화면 공유·음성/채팅 소통으로 오프라인 교실감을 온라인에서 구현한 서비스	원격·소외지역 보조 교육, 온라인 멘토링·커뮤니티
위니브월드, 위니빌리지	게임형 웹 기반 코딩(파이썬) 실습 환경 / 실시간 채팅 기반 학습자 커뮤니티	초등 트랙 실습 환경, 수료 후 질의응답·네트워킹


2. 사업수행실적

2.1 정부·공공기관 인력양성사업 수행실적 (최근 3년, 15건)

연 번	사업명	사업기간	사업비(원)	발주기관
1	0000 합동 AI 해커톤 캠프 운영 (35명 수료)	26.07	95,000,000	교육부
2	0000 AI·ICT 사회혁신 프로젝트 - AI Agent 기반 업무 자동화 (45명 수료)	26.03~26.07	120,000,000	교육부
3	0000 AI 런케이션 프로그램 운영 (120명 수료)	25.12~26.01	350,000,000	교육부
4	성인학습자 취·창업 역량강화 실무 교육(바이브 코딩·AI Agent) (100명 수료)	25.11~26.01	290,000,000	고용노동부
5	0000 권역사업 0000 인력 AI 역량강화 교육 (210명 수료)	25.09~25.11	640,000,000	과학기술정보통신부
6	0000 권역 0000 해커톤 프로그램 운영 (150명 수료)	25.07~25.09	410,000,000	과학기술정보통신부
7	2025년 0000 재직자 AI 전환 집중과정 0000 (320명 수료)	25.06~25.12	980,000,000	교육부
8	0000 전문교과 동계 기술연수 위탁 용역 (50명 수료)	25.01	140,000,000	교육부
9	0000 챌린지 해커톤 운영 (180명 수료)	24.11~25.12	520,000,000	교육부
10	제2회 0000 AI 오픈소스 경진대회 (85명 수료)	24.06~24.07	240,000,000	과학기술정보통신부
11	0000 신규인력 Skill-up ICT/SW 교육 운영 (90명 수료)	24.05~24.07	260,000,000	과학기술정보통신부
12	해외 0000 스마트팜 구축 해커톤 대회 (110명 수료)	24.01~24.02	320,000,000	과학기술정보통신부
13	0000 코딩 베이스 캠프 (65명 수료)	24.01~24.02	180,000,000	교육부
14	0000 소프트웨어 테크 커넥트 (75명 수료)	23.12~24.01	210,000,000	교육부
15	해외 0000 IT분야 맞춤형 취업 역량강화 교육 (60명 수료)	23.11~24.01	160,000,000	고용노동부

※ 사업명·발주처 세부 표기는 0000로 처리한 샘플 값임. 사업기간이 최근인 순서로 정렬하였음. 정량 평가 기준(공고일 기준 최근 3년, AI 관련 교육 실적) 충족 실적은 15건 전건이며, 총 수료 인원은 1,695명임. 상기 15건은 모두 중도 해지·감액·제재 이력 없이 계약 기간 내 정상 완료하였고, 발주기관 검수를 완료하여 정상 준공 처리되었음

2.2 바이브 코딩·ICT 행사 자체 운영 실적 **과업 ①③ 직결**



[그림 II-3] 자체 운영 프로그램: 바이브 사계 런케이션·바이브 코딩 부트캠프·제주 AI 컨퍼런스

프로그램	형태	내용
바이브 코딩 부트캠프	4~7일 온라인	AI 프롬프팅 → 디자인 구현 → 배포·런칭까지 웹·앱 서비스 개발 전 과정. 다수 기수 반복 운영
바이브 사계(런케이션)	4박 5일 오프라인(제주)	아이디어를 실제 작동하는 서비스로 완성하는 바이브 코딩 집중 프로그램
사내 AI 해커톤	1주일 사내	전 직원이 AI 도구로 사내 시스템 개선 결과물을 구현·발표하는 내부 훈련
○○랩 챌린지 / 제주 AI·웹 컨퍼런스	3박 4일 해커톤 / 오프라인 행사	디지털 기술로 제주 지역 현안을 해결하는 해커톤, 도내 최대 규모 기술 컨퍼런스 직접 기획·운영
제주 코딩/알고리즘 베이스 캠프	5~6일 / 2박 3일	교육과 해커톤이 결합된 집중형 오프라인 캠프

2.3 AI·바이브 코딩 분야 자체 출판 도서 (17종) **과업 ④ 대응**

분야	도서명
바이브 코딩	바이브 코딩 에센셜 with Claude Code / 딱 필요한 만큼: 바이브 코딩을 위한 HTML · 깃허브(GitHub) · 웹 서비스 구조 · 마크다운 · 정보보안과 법
생성형 AI 기초	딱 필요한 만큼: 생성형 AI 기초 / ChatGPT 에센셜 / NotebookLM 에센셜 / 생성형 AI와 Notion으로 배우는 디지털 전환 실무
AI 도구 실무	클로드 코드 에센셜 / Claude Design 에센셜 / Claude Desktop 에센셜 / Claude Cowork 에센셜 / Google Flow 에센셜 / Google Antigravity 에센셜
프롬프트 엔지니어링	프롬프트, 컨텍스트, 하네스 엔지니어링 에센셜

- **(교재 베이스라인)** 상기 17종은 제안사가 직접 집필·편집·출판하여 리디북스·교보문고·알라딘 등 외부 서점과 **자체 플랫폼인 위니박스**를 통해 유통 중인 도서로, 과업 ④의 대상별 교재 개발 시 **검증된 원고를 베이스라인**으로 활용하여 개발 기간을 단축함. 특히 「딱 필요한 만큼: 바이브 코딩을 위한 정보보안과 법」은 미성년자 대상 AI 윤리·개인정보 단원의 근거 자료로 활용함


3. 경영상태

항목	내용	증빙
기업신용평가등급	○○	신용평가등급확인서(○○평가정보, 입찰공고일 기준 최근 1년 이내 평가분)
세부 재무수치	표준재무제표로 같음	표준재무제표증명(국세청 발급, 2025 사업연도)

- **(안정운영)** 2020년 1월 설립 이후 6년 연속 안정적으로 운영하고 있으며, 정부·공공 인력양성사업 **15건**을 모두 정상 완료하였음(중도 해지·부정당업자 제재 이력 없음).
- **(이행능력)** 본 사업은 자체 보유 플랫폼·교재·강의실·장비·상근 인력으로 **계약 직후 즉시 착수함**. 대규모 선행 투자가 불요하며, 계약 체결 시 「지방계약법」에 따른 계약 이행보증을 납부함
- **(사회적 책임)** 「근로기준법」상 체불사업주 명단 공개 및 적극적 고용개선조치 미이행사업주 공표 이력이 없으며, 행정처분내용 확인서(서식12)로 증빙함
- **(청년 일자리)** 2026년 5월 **제주특별자치도 「청년동행 일자리 우수기업」**에 선정됨(도내 3개사, 지원 2026.6~2028.5). 인위적 인력 감축이 없고 청년 노동자에게 제주도 생활임금 이상을 지급하는 등 고용 안정성·재무 건전성을 도(道)로부터 검증받은 **청년 정착형 지역 기업임**

4. 조직 및 인력현황

4.1 회사 조직도

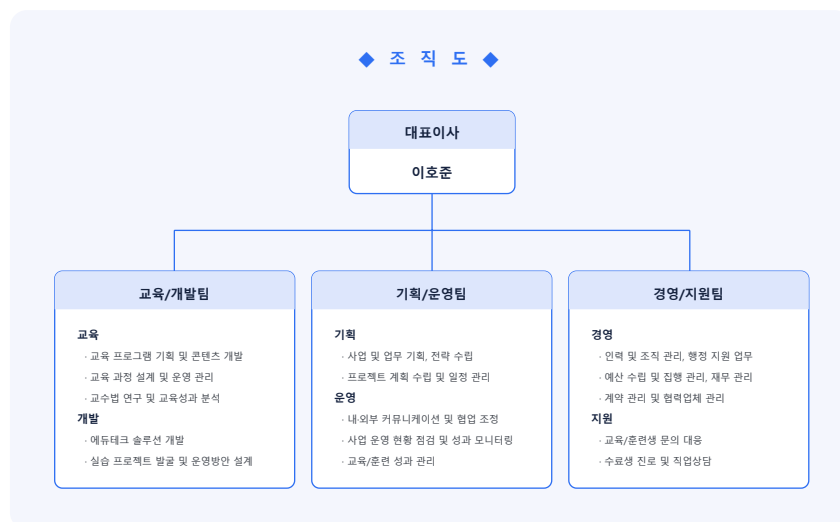

[그림 II-4] 제안사 조직도 (대표 아래 3개 팀 · 상근 정규직 30명)

4.2 전문인력 보유 현황 정량평가 대응

연번	성명	직위/역할	최종학력(전공)	전문 분야	경력	본 과업 담당
1	이호준	대표 / 사업책임자(PM)	○○대학교 석사 (컴퓨터공학)	AI·생성형 AI·AI Agent 업무 자동화 (전자책 150권 저자, 인프런 수강생 10만+)	18년 4개월	총괄·발주처 협의·제안 설명
2	김00	기술이사 (CTO)	○○대학교 박사 (컴퓨터공학)	AI Agent 아키텍처·MLOps·LLM 응용	16년 2개월	AI Agent 커리큘럼 총괄, 기술 검수
3	문00	책임강사	○○대학교 박사 (컴퓨터공학)	데이터분석·AI·SW 개발, ○○대 겸임교수	14년 8개월	강사 양성 공통과정 주강사, 수업 품질 감리 (QA)
4	오00	수석강사	○○대학교 석사 (컴퓨터공학)	SW·AI·머신러닝, KDT 메인강사	13년 5개월	전문강사 심화과정 주강사, 수업 품질 감리(QA)
5	한00	수석강사	○○대학교 석사 (인공지능)	생성형 AI·AI Agent 업무 자동화 설계	12년 9개월	Agent 자동화 트랙 주강사, 성인 교육 총괄
6	박00	책임 디자이너	○○대학교 석사 (디자인학)	교육 콘텐츠 디자인·UX/UI	12년 3개월	교재·VOD·행사 디자인 총괄
7	최00	선임 개발자	○○대학교 (컴퓨터공학)	백엔드 개발·클라우드 인프라	11년 7개월	플랫폼(LMS) 운영·유지보수, AI 계정 관리
8	강00	선임 개발자	○○대학교 (컴퓨터공학)	프론트엔드 개발·웹 서비스	11년 1개월	실습 환경 구축, 산출물 아카이브 운영
9	윤00	선임 개발자	○○대학교 (소프트웨어공학)	AI Agent 개발·API 도구 연동	10년 8개월	Agent 실습 환경 구축·기술 지원
10	장00	선임 디자이너	○○대학교 (시각디자인학)	교재 편집 디자인·인포그래픽	10년 4개월	교재 12종 디자인, 홍보물 제작
11	신00	선임 강사	○○대학교 (컴퓨터교육)	SW 교육·교수법 연구	10년 0개월	학생 교육 주강사, 지도교사 연수
12	안00	선임 강사	○○대학교 (데이터사이언스)	데이터분석·AI 활용 교육	9년 8개월	학생 교육 주강사, 챌린지 심사
13	송00	선임 매니저	○○대학교 (경영학)	교육기획·사업 운영 행정	9년 5개월	교육과정 설계서, 모집·선발 행정
14	유00	선임 개발자	○○대학교 (컴퓨터공학)	데이터 엔지니어링·DB 설계	9년 2개월	LMS 데이터·대시보드 개발
15	백00	선임 디자이너	○○대학교 (산업디자인학)	영상 기획·모션 그래픽	8년 11개월	VOD 강의 30개(300여개 영상) 제작·편집
16	고00	강사	○○대학교 (컴퓨터공학)	SW 교육·바이브 코딩	8년 6개월	학생 교육 주강사, 실습 지도
17	양00	강사	○○대학교 (컴퓨터교육)	SW 교육·AI 리터러시	8년 2개월	학생 교육 주강사, 학부 모 교육

연번	성명	직위/역할	최종학력(전공)	전문 분야	경력	본 과업 담당
18	부00	강사	○○대학교 (소프트웨어공학)	AI Agent 업무 자동화 실습	7년 10개월	성인 Agent 자동화 교육 주강사
19	현00	강사	○○대학교 (컴퓨터공학)	웹 서비스 개발·배포	7년 6개월	학생 교육·실습 보조, 챌린지 운영 지원
20	진00	강사	○○대학교 (데이터사이언스)	데이터 시각화·AI 활용	7년 3개월	학생 교육·실습 보조, 산출물 심사
21	노00	개발자	○○대학교 (컴퓨터공학)	백엔드 개발·서버 운영	6년 11개월	플랫폼 안정화·장애 대응
22	하00	개발자	○○대학교 (소프트웨어공학)	프론트엔드 개발·접근성	6년 7개월	웹 교안 플랫폼 개선
23	권00	디자이너	○○대학교 (시각디자인학)	UI 디자인·브랜딩	6년 3개월	교재·슬라이드 디자인
24	배00	디자이너	○○대학교 (산업디자인학)	영상 편집·촬영	6년 0개월	VOD 촬영·편집, 행사 기록
25	정00	매니저	○○대학교 (경영학)	교육 운영 행정·정산	5년 9개월	출결·정산·성과품 관리
26	남00	매니저	○○대학교 (경영학)	행사 기획·현장 운영	5년 5개월	챌린지 본행사 운영, 홍보
27	조00	강사	○○대학교 (컴퓨터공학)	SW 교육·실습 코칭	5년 1개월	학생 교육 실습 보조
28	임00	강사	○○대학교 (컴퓨터교육)	SW 교육·교안 개발	4년 9개월	지도교사 교재 개발, 실습 보조
29	서00	보안 담당	○○대학교 석사 (정보보호)	정보보안·개인정보보호	4년 5개월	보안체계 운영, 개인정보 파기 관리
30	홍00	매니저	○○대학교 (경영학)	모집·상담 행정	4년 1개월	모집 상담, 만족도 조사 운영

※ 상근 정규직 30명 전원의 현황이며, 성명은 샘플 공개를 위해 대표를 제외하고 성(姓)만 표기함. 본 과업 투입 인력은 Ⅲ-3 인력운영계획에서 별도 제시함

4.3 시설·장비 현황

시설명	보유	수용인원	장비명	수량	용도
강의실	임차	80명 / 220㎡	노트북(고사양)	60대	실습
회의실	임차	6명 / 10㎡	빔프로젝터	1대	강의
스튜디오 2실	임차	각 1명 / 계 10㎡	무선마이크	2개	강의·행사
			책상 / 의자	30 / 30	실습

※ 임차기간 20○○년 ○월까지 확보 완료(제주시 ○○로 00, 0층)

※ 영상 스튜디오 보유로 과업 ④ VOD 강의 30개 (300여 개 영상)를 외주 없이 자체 제작함

Ⅲ


사업수행계획

1. 사업수행전략

1.1 총괄 추진 전략

추진 슬로건: "제주가 키우고, 제주가 가르치는 AI"

양성(Train) → 투입(Deploy) → 확산(Scale)의 선순환 구조를 사업 기간 내에 완성하고, 그 결과물(강사풀·교재·VOD·플랫폼·산출물)을 지역 자산으로 남김

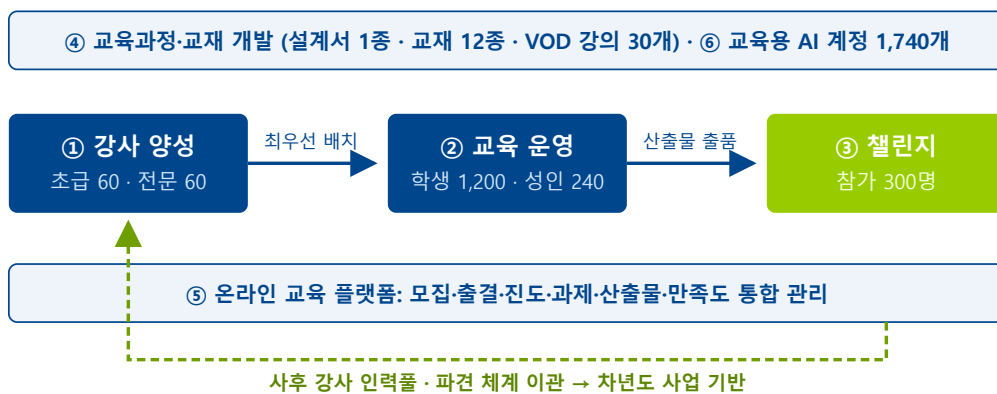

[그림 Ⅲ-1] 과업 ①~⑥ 통합 추진 체계도

- **(통합운영)** 과업 ①~③의 모집·출결·진도·과제·산출물·만족도를 자체 LMS 한 곳에서 관리하고, 발주처에 실시간 진척 대시보드를 제공함
- **(2트랙 편성)** 전 과업의 교육을 **A트랙(Agent형 AI 업무 자동화)·B트랙(AI 활용 앱 제작)** 2개 트랙으로 편성하여, 업무 혁신을 원하는 학습자와 원하는 웹·앱을 직접 만들려는 학습자가 각자의 목적에 맞는 산출물(1인 1AI Agent / 1인 1AI 앱)을 완성하도록 함(I-1.2)
- **(방법론 일치)** 자체 검증된 바이브 코딩 5단계 프로세스(기획→초안→기능→디자인→완성)를 강사 양성·학생 교육·챌린지에 **동일하게 적용**하여, 강사가 배운 방식 그대로 학생을 가르치도록 함
- **(애자일 교재)** 교재를 웹 교안 플랫폼으로 배포하여 현장 피드백을 24시간 내 반영함

1.2 [과업 ①] AI 강사 양성 프로그램 (초급·전문 2트랙, 120명)

다채널 모집	역량 진단·선발	공통 128h	심화 32h	인증 평가	인력풀 배치
--------	----------	---------	--------	-------	--------

가. 모집 및 선발

- **(모집전략)** 도내 네트워크(대학·○○인재센터·청년센터·교원단체·기존 수료생 커뮤니티)를 활용한 다채널 모집으로 **목표 대비 200% 지원자**를 확보하고, 중도 이탈을 감안하여 **목표 대비 150%를 선발함**
- **(자격확인)** 모집 공고일 현재 주민등록상 주소지가 제주특별자치도인 도민을 대상으로 하며, 트랙별 자격요건 충족 여부를 서류로 확인함
 - 초급 트랙(60명): SW/AI 교육 관심도 및 기본 컴퓨터 활용 역량 확인
 - 전문 트랙(60명): 전년도 전문강사 양성 수료자, SW·디지털·IT 강사 경력 1년 이상, 관련 학과 전공자 중 1개 이상 충족 여부를 확인하고 사전 역량 진단(온라인 테스트+포트폴리오)으로 선발
- **(전력조회)** 학생 교육 프로그램에 배치할 강사 전원에게 「성범죄 경력 조회 및 아동학대관련범죄 전력 조회 동의서」를 모집 단계 필수 서류로 징구하고, 조회를 완료한 강사만 배치함

나. 교육 설계 (온·오프라인 하이브리드)

구분	초급 강사 (60명)	전문 강사 (60명)
목표 역량	[생성형 AI 교육자 인증 수준] AI 도구 기초 활용, 프롬프트·컨텍스트 엔지니어링 설계, 교육 콘텐츠 생성 자동화, 수업 준비·평가를 대신 수행하는 AI Agent 제작, 미성년자 대상 AI 윤리·환각 검증 지도	[엔터프라이즈 AI 실무 인증 수준] 클라우드 인프라·API 연동 이해, 바이브 코딩 앱 빌드 실무, 업무 자동화 AI Agent 설계·배포(도구 연동·작업 위임·검증 루프) , ML/DL 기초 적용 로직 구현, 12H+ 해커톤 멘토링·디버깅 코칭
교육 시간	공통 128h (16회차)	공통 128h + 심화 32h (4회차) = 160h
운영 방식	LMS 사전학습(이론·VOD) + 오프라인 부트캠프(실습·티칭 시연)	좌동 + 12H+ 해커톤 멘토링 실전 참여
평가·인증	마이크로 티칭 기반 실전 모의수업 + 프로젝트 평가 (필기시험 미 실시)	프로토타입 App 1종 + 엔터프라이즈 AI 도입 심화 프로젝트 기획서 심사
산출물	교육용 프롬프트 템플릿 3종 이상, 단위 수업 지도안	바이브 코딩 프로토타입 App 1종 이상, 업무 자동화 AI Agent 1종 이상 , 심화 프로젝트 기획서

다. 커리큘럼

회차	구분	주요 교육 내용	시간
【공통 과정】 초급·전문 합동 · 총 128h			
1~4	생성형 AI 기초 + AI 엔지니어링의 흐름	모델·토큰·추론의 원리와 환각 검증 기법, 프롬프트 → 컨텍스트 → 하네스 → 루프 엔지니어링으로 이어지는 AI 협업 흐름 실습, 교육 콘텐츠(지도안·퀴즈) 생성 자동화	32h
5~8	바이브 코딩 기초 지식 (마크다운·HTML·웹 구조·GitHub)	AI와 주고받는 마크다운 문서 작성, HTML로 보고서·제안서·기획서 제작, 웹 서비스 구조 이해, 배포 (GitHub Pages)까지의 최소 지식 실습	32h

회차	구분	주요 교육 내용	시간
9~12	바이브 코딩 실전 + Agent 형 AI 업무 자동화 (데이터 연동·도구 연동·보안)	바이브 코딩으로 웹 서비스 제작, 데이터 조회·저장을 포함한 간단 풀스택 구현에 이어, 반복 업무를 대신 수행하는 AI Agent 제작 (업무 정의 → 도구·데이터 연동 → 작업 위임 → 결과 검증 루프 설계), 정보보안과 법 기초(개인정보·배포 보안)	32h
13~16	실전 교수 역량 검증 및 자격 인증	마이크로 티칭 기반 개인별 실전 모의수업, 상호 피드백, 역량 체크리스트 도달도 평가	32h
【전문 심화 과정】전문 트랙 전용 · 총 32h			
17	엔터프라이즈 AI 인프라 이해	클라우드 아키텍처·API 연동 구조, ML/DL 기초 개념 적용 시스템 로직 구현	8h
18	바이브 코딩 마스터 & AI Agent 설계	생성형 AI 기반 5단계(기획·초안·기능·디자인·완성) 개발 프로세스, 자연어 디버깅, 업무를 위임받아 스스로 수행하는 AI Agent 설계·운영 실습	8h
19	실전 개발 및 데이터 연동	오픈소스 플랫폼 기반 프론트·백엔드 연결, 데이터 조회·저장(DB) 기능 구현	8h
20	해커톤 멘토링 및 코칭	12H+ 장기 해커톤 프로젝트 지도법, 기술 오류 대처, 학생 주도 코드 디버깅 코칭	8h

※ 세부 커리큘럼은 교육과정 설계서 확정 시 발주처와 협의함

□ 인증 평가 기준(안): 엄격한 훈련·평가

평가 요소	배점	평가 방법
마이크로 티칭	40점	개인별 실전 모의수업으로 수업 설계·전달력·상호작용·미성년자 대상 AI 윤리 지도를 체크리스트로 평가(초급·전문 공통)
프로젝트 평가	40점	초급: 교육용 프롬프트 템플릿 3종 이상 + 단위 수업 지도안 심사 / 전문: 프로토타입 App 1종 이상 + 엔터프라이즈 AI 도입 심화 프로젝트 기획서 심사
과정 참여도	20점	출석률·과제 제출·동료 피드백 참여도
수료 기준	총점 70점 이상 + 출석률 80% 이상이며, 미도달자는 보강 지도 후 재평가를 1회 실시함(세부 기준은 교육과정 설계서 확정 시 발주처와 협의함)	

라. 자격증 취득 지원 및 사후 활용 계획 **필수 요구**

- (자격증 지원) AI 관련 자격증 응시 대비 특강을 편성하고 응시료를 지원하며, 수료 후 자격 취득 현황을 추적하여 최종보고서에 반영함
- (자격증 공동개발) 본 사업 커리큘럼과 인증 평가 체계를 기반으로 발주처와 **제주 지역 AI 교육 역량 자격(인증) 과정을 공동 개발**하는 방안을 제안함. 수료 강사에게 우선 응시 기회를 부여하고, 차년도 강사 자격요건과 연계하여 지역 자격 체계로 정착 시킴(발주처 협의 후 진행)
- (인력풀 DB) 수료 강사를 **인력풀 DB(전문분야·가용시간·거주 권역·조회 완료 여부)**로 구축하고, 과업 ②의 주강사·보조강사로 즉시 배치함
- (사후이관) 사업 종료 시 인력풀 DB와 파견 운영 절차서를 발주처에 이관하여, 도내 학교·기관이 지속적으로 강사를 요청·배치할 수 있는 체계를 남김

1.3 [과업 ②] AI 교육 프로그램 개발·운영 (학생 1,200명 + 학부모 240명)

가. 강사 배치 원칙 양성 강사 최우선 투입

- (최우선 투입) 본 과업 및 전년도 사업으로 검증·양성된 **지역 전문강사 풀을 최우선 투입**함. 주강사는 전문 트랙 수료 강사, 보조강사는 초급 트랙 수료 강사로 페어링하여 현장 경험을 함께 축적함
- (품질감리) 제안사 소속 시니어 강사(수석·책임)가 수업 품질 감리(QA)를 담당하여 회차별 순회 점검함

나. 학생 정규과정 (초·중·고 1,200명, '1인 1AI 앱')

학년군	목표 산출물	주요 교육 내용	실습 환경
초등 (8h)	AI 체험형 웹 앱 (웹 페이지형)	AI와 대화하기(안전한 사용 규칙·환각 판별) → 프롬프트로 그림·글·퀴즈 만들기 → 자연어 프롬프트로 나만의 웹 페이지 만들기 → 친구들 앞에서 발표·공유	웹 기반 실습 환경 (브라우저만으로 실습)
중등 (12h)	간단한 웹 서비스	프롬프트·마크다운 기초 → 바이트 코딩(기획→초안→기능)으로 간단한 웹 서비스를 직접 제작 → 자연어 디버깅 → 완성·배포(GitHub Pages) → 발표	고사양 노트북 + 격리망 + 클라우드 실습 환경
고등 (16h)	데이터 연동 App + 업무 자동화 AI Agent	바이트 코딩 5단계 전 과정 → 데이터 연동(조회·저장)까지 구현 → 학습·동아리 반복 업무를 대신 처리하는 AI Agent 제작(작업 정의·도구 연동·결과 검증) → 배포·발표, 우수작 챌린지 출품 연계	고사양 노트북 + 격리망 + 클라우드 실습 환경

- (운영형태) 학교 방문형(도내 학교 공문 발송·수요 조사)과 거점형(제안사 강의실·권역 거점)을 병행하여 목표 1,200명을 달성함. 학교별 수요조사 → 일정 확정 → 사전 장비 반입 → 수업 → 산출물 등록의 표준 절차로 운영함
- (문제해결형) 급식·버스·관광·환경 등 **제주 생활 문제를 주제**로 자연어 코딩을 진행하여, 단순 흥미 유발을 배제하고 실질적 문제 해결 경험을 제공함
- (실습환경) 원활한 컴파일과 앱 빌드를 위해 **고사양 자체 노트북을 반입**하고, 위성 인터넷 회선을 포함한 자체 휴대용 회선으로 학교망과 분리된 격리 네트워크를 구성하여 학교 정보 시스템에 영향을 주지 않음
- (클라우드 실습) 중·고등 트랙에는 **실습용 클라우드 환경을 별도 구축·제공**하여 학교 PC 사양·설치 제약 없이 동일한 개발 환경에서 실습하도록 하고, 수업 종료 후에도 산출물에 접근할 수 있도록 사업 기간 내 유지함
- (에이전트 확장) 중·고등 트랙은 앱 완성에서 멈추지 않고 **‘내 일을 대신 하는 AI’ 1종 제작**을 필수 과제로 운영함. 학습 계획 관리·자료 정리·설문 집계처럼 학습자가 실제

로 반복하는 일을 Agent에게 위임해 보게 하여, AI를 ‘쓰는 사람’에서 ‘일을 시키는 사람’으로 전환시킴

- (산출물 관리) 개인별 앱과 AI Agent를 LMS에 포트폴리오로 등록하고, 우수작을 챌린지 출품으로 연계함

□ 목표 인원(1,200명) 달성을 위한 세부 추진 방법

단계	추진 내용	시기
① 수요조사	도내 전 초·중·고 대상 교육 안내 공문 발송 및 수요조사를 실시하고, 교육청·학교와 협력하여 방문형 수요를 조기 확보	착수 즉시
② 배정·확정	신청 학교를 권역·학년군별로 균형 배정하고 학사일정에 맞춰 수업 일정을 확정, 신청 미달분은 거점형 과정으로 흡수	8~9월
③ 사전 준비	학교별 사전 답사(교실·전원·공간 확인), 노트북·격리망 반입 계획 수립, 강사 배치 확정	수업 2주 전
④ 운영·관리	수업 운영 및 회차별 출결·산출물·만족도를 LMS로 집계, 주간보고에 누적 인원 대비 달성률 명시	9~12월
⑤ 보완 운영	달성률 지연 권역 발생 시 거점형 추가 개설·주말반 편성으로 즉시 만회	상시

※ 월별 운영 규모(안): 9월 240명 → 10월 360명 → 11월 360명 → 12월 240명 누적 1,200명. 학교 학사일정에 따라 발주처와 협의하여 조정함

□ 학급 편성·표준 시수 및 강사 배치 기준(안)

학급 편성	1개 반 20명 내외 · 총 60개 반 내외로 편성하며, 학교 신청 규모에 따라 반 수를 증감함
표준 시수(안)	초등 8h(2h×4차시) / 중등 12h(2h×6차시) / 고등 16h(2h×8차시). 전 학년군 '1인 1AI 앱' 완성이 가능한 최소 시수 로 설계하며, 학교 학사일정·요구에 따라 발주처와 협의하여 확정함
강사 배치	반당 주강사 1명 + 보조강사 1명(2인 1조) 배치, 시니어 강사 QA 순회 점검 병행
수료 기준	전원 '1인 1AI 앱' 완성을 수료 기준으로 관리하고, 미완성 학생은 보강 지도로 완성까지 지원함


□ 차시 운영 흐름 예시(안): 중등 12h(2h×6차시) 기준

차시	단계	주요 활동
1~2	기획: 문제 정의·초안	생성형 AI 안전 사용 규칙, 제주 생활 문제 선정·기획서 작성, 자연어 프롬프트로 앱 화면 초안 생성
3~4	기능 구현	핵심 기능을 자연어로 구현·테스트하고, 오류를 AI와 함께 찾아 고치는 자연어 디버깅 실습
5	디자인·완성	UI 다듬기, 앱 완성·배포 및 LMS 포트폴리오 등록
6	발표·공유	개인별 앱 시연·상호 피드백, 우수작 챌린지 출품 연계

※ 초등 8h·고등 16h는 동일한 5단계 흐름에서 차시 수를 증감하여 편성하며, 세부 차시안은 교육과정 설계서로 확정함

다. 학부모 교육 (소외지역 중심 240명)

- (권역구획) ‘찾아가는 교육’을 읍·면 지역 권역 4개(주력)와 제주시·서귀포시 핵심 권역 2개(보완), 총 6개 권역으로 구획하여 순회 운영하고, 일정을 사전 공지하여 접근성을 확보함. 지역 권역은 읍·면 행정복지센터·도서관을 거점으로 밀착 순회하고, 핵심 권역은 대중교통 결절지의 접근성을 활용해 인근 읍·면 주민과 미달 권역 수요를 흡수함
- (5단 구성) 커리큘럼 5단 구성
 - ① AI 시대의 변화 이해: 생성형 AI가 바꾸는 직업·교육·일상의 변화 흐름을 먼저 숙지
 - ② 자녀의 바이브 코딩 결과물 이해·공유: 학생 산출물을 함께 실행해 보며 자녀의 학습 내용을 체감
 - ③ 생성형 AI 시대 디지털 리터러시·윤리: 딥페이크·개인정보·환각 정보 판별, 가정 내 AI 사용 규칙 수립
 - ④ 업무 생산성에서 업무 자동화로: 도구를 ‘쓰는’ 단계를 넘어 반복 업무를 대신 수행하는 AI Agent를 직접 만들어 보는 실습 (민원·행정 서식 자동 작성, 소상공인 재고·정산 정리, 가정 일정 관리 등 실제 업무 1건을 Agent에 위임)
 - ⑤ 우리 자녀가 살아갈 미래 사회 준비: AI 시대의 진로·학습 방향과 가정에서의 지원 방법 안내
- (KPI 증빙) 참석자 명단과 만족도 조사 결과를 권역별로 관리하여 KPI 증빙 자료로 제출함

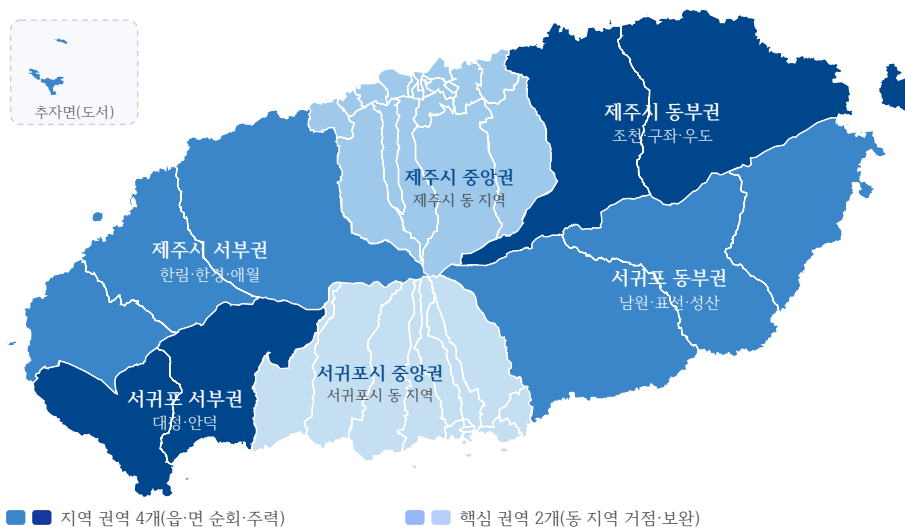

[그림 Ⅲ-2] 학부모 ‘찾아가는 교육’ 6개 권역 순회 계획도 (지역 권역 4 × 2회 + 핵심 권역 2 × 1회 = 총 30회 내외 · 240명) ※ 경계: 통계청 통계지리정보 읍·면·동 행정경계

□ 목표 인원(240명) 달성을 위한 세부 추진 방법

모집 채널	읍·면 행정복지센터·도서관 협조 공문, 학생 교육 참여 학교의 가정통신문 연계, 마을 커뮤니티 홍보물 배포 등 자녀 교육과 연계한 모집 으로 참여 동기를 확보함
-------	--

운영 회차(안)	지역 권역 4개 × 6회 = 24회 + 핵심 권역 2개 × 3회 = 6회, 총 30회 내외 · 회당 8명 내외로 순회 운영하며, 수요에 따라 회차를 증설하고, 생업 부담을 고려하여 야간·주말 회차를 병행 편성함(발주처 협의 후 진행)
회당 구성(안)	AI 시대의 변화 이해(20분) → 자녀 결과물 체험(30분) → 리터러시·윤리(25분) → 생산성 AI 도구 실습(30분) → 자녀의 미래 사회 준비(15분), 회당 2시간 내외로 구성하고, 현장 수요에 따라 조정함
미달 대응	신청 미달 시 인접 권역 통합 운영과 핵심 권역 추가 회차 즉시 개설로 만회하고, 주간보고에 권역별 누적 인원 대비 달성률을 명시함

1.4 [과업 ③] 제주 바이브 코딩 챌린지 (300명 내외)

- (전담조직) ○○랩 챌린지·○○권역 IS 해커톤·제주 AI 컨퍼런스 등 도내 ICT 행사를 직접 기획·운영한 자체 행사팀이 전담함
- (축제형 구성) 참여·체험·공유 중심의 AI 축제 형태로 4부 구성하여, 전시성 행사를 탈피함

프로그램	운영 내용	대상
① 바이브 코딩 배틀 (라이브 챌린지)	현장에서 제시되는 제주 지역 문제(환경·관광 등)를 즉석 AI 프롬프팅으로 해결하는 해커톤 형식. 대형 스크린 실시간 중계로 관람형 재미 확보	학생·강사 팀
② 산출물 전시·발표	교육 기간 중 제작한 학생·강사 AI 앱 부스 전시 및 무대 발표, QR 기반 관람객 체험 투표	수료생 전원
③ 체험존	학부모·일반 도민 대상 바이브 코딩 체험 부스 운영	학부모·도민
④ 바이브 코딩 컨퍼런스	학생·강사·개발자가 교육과 현장에서 경험한 바이브 코딩 사례를 서로 공유하는 발표 세션. 룸을 나누어 룸당 2~3개 프로그램을 병행 운영	참가자·도민

- (훈격확보) 도지사상·기관장상 등 시상 훈격 확보 절차를 착수 단계부터 개시하여 공문 협의·심사 규정 정비를 사전에 완료함
- (공정성) 외부 전문가와 교육 강사단으로 심사위원회를 구성하고, 규정집·심사표를 사전 공개함. 행사 종료 후 규정집·심사자료·홍보물·사진/영상 자료를 ‘AI 교육 행사 자료 1식’으로 제출함

□ 행사 운영 계획(안)

개최 시기	2026년 12월 초 본행사 1일, 최종보고 일정과 분리하여 발주처와 협의 확정함
개최 장소	접근성·수용 인원(300명 내외)·전원·네트워크 요건을 기준으로 도내 후보지를 사전 답사한 후 발주처 협의로 확정함
당일 운영(안)	개회·규정 안내(30분) → 바이브 코딩 배틀 예선(90분) → 산출물 전시·체험존 관람 및 바이브 코딩 컨퍼런스(90분, 룸별 2~3개 프로그램 병행 운영) → 배틀 결선·무대 발표(90분) → 심사·시상·폐회(60분). 세부 시간표는 발주처와 협의하여 확정함
홍보	교육청·학교 공문 및 참여 학교·학부모 초청, 제안사 개발자 커뮤니티·제주 AI 컨퍼런스 연계 홍보, 보도자료 배포로 참관 수요를 확대함

시상(안)	바이브 코딩 배틀·산출물 전시 등 부문별 시상으로 구성하고, 훈격·부문·규모는 확보된 훈격에 따라 발주처와 협의하여 확정함
안전·운영	행사 안전관리 담당자 지정, 미성년 참가자 보호자 동의·인솔 체계 운영, 행사보험 가입, 사진·영상 촬영 동의 징구

1.5 [과업 ④] 실습 중심 AI 교육과정 및 교재 개발

산출물	세부 내용	제작 방식
교육과정 설계서 1종	대상별(강사 정규·전문 심화·학생 3트랙·학부모) 상세 설계, 목표 역량·회차별 학습목표·평가 기준·실습 환경 요건 포함	자체 교육기획팀
맞춤형 교재 12종	전문강사용 2종 / 학습자용 4종(초·중·고·성인) / 지도교사용 4종 / 학부모·도민용 2종. 각 종은 A트랙(업무 자동화)·B트랙(앱 제작) 단원을 함께 담으며, 웹 교안 + PDF 병행 제공, AI 윤리·환각 검증 단위 필수 포함	자체 집필·편집 (도서 17종 기반)
온라인 VOD 강의 30개 (300여 개 영상)	바이브 코딩 전 과정을 학습자 수준별로 분리 제작함 . 초등 5개·중등 7개·고등 8개·지도교사(전문강사 겸용) 10개로 총 30개 강의(300여 개 영상) 를 제작하여, 하나의 영상을 전 대상이 공용하는 방식의 학습 격차를 해소함	자체 영상 스튜디오 (외주 없음)

- **(애자일 반영)** 웹 교안 플랫폼으로 배포하여 현장 피드백을 **24시간 내 교재에 반영**하는 애자일 운영을 적용함. PDF 판은 회차별 확정본을 기준으로 발행함
- **(자체제작)** VOD는 외주 없이 자체 스튜디오에서 제작하므로 품질과 일정을 직접 통제하며, 발주처 검수 의견을 즉시 재촬영·편집에 반영함

□ 온라인 VOD 대상별 강의 30개(300여 개 영상) 구성(안) 요구 기준의 2배

대상	강의 수	영상 수	세부 강의 구성(안)
초등 학생용	5개	45개	AI 안전 사용 약속 → 프롬프트 놀이 → 우리 마을 문제 찾기 → 나만의 앱 만들기 → 실행·공유
중등 학생용	7개	70개	생성형 AI 이해·안전 사용 → 프롬프트 기초 → 마크다운·웹 서비스 구조 → 바이브 코딩 5단계 → 기획(제주 생활 문제)·프로토타입 → 기능 구현·자연어 디버깅 → 완성·배포·포트폴리오
고등 학생용	8개	85개	생성형 AI 이해·안전 사용 → 프롬프트·컨텍스트 엔지니어링 → 마크다운·HTML 문서 제작 → 웹 구조·GitHub → 바이브 코딩 5단계 → 기획·프로토타입·기능 구현 → 데이터 연동(간단 폴스택)·배포 → AI 윤리·환각 검증·정보보안
지도교사용 (전문강사 겸용)	10개	105개	AI 교육 방향·교수 설계 → 프롬프트·컨텍스트 심화 → 하네스·루프 협업 구조 → 웹 교안·HTML 수업자료 제작 실무 → GitHub 수업 운영법 → 5단계 수업 설계·학년군별 난이도 조절 → 실습 트러블슈팅·디버깅 지도법 → Agent형 AI 업무 자동화 지도법 → 산출물 평가·피드백 기준 → AI 윤리·저작권·정보보안과 법
합계	30개	305개	요구 기준(15차시 이상) 대비 2배의 강의 수·300여 개 영상을 외주 없이 자체 스튜디오에서 제작

※ 대상별 분리 제작으로 학생은 자기 학년 수준의 영상만, 지도교사는 교수법이 포함된 전용 영상을 학습함. 강의·영상 구성은 교육과정 설계서 확정 시 발주처와 협의하여 조정함

1.6 [과업 ⑤] 온라인 교육 플랫폼 구축·운영(즉시 가동)

과업지시서 요구 기능	자체 LMS 대응 현황	상태
VOD 강의·실시간 강의	VOD 호스팅 및 실시간 화상 강의 연동 기능 운영 중	기보유
학습 자료·과제 제출·피드백	과제함·첨삭 피드백·재제출 워크플로 운영 중	기보유
학습 진도 관리·이력 추적	교육생별 출결·진도율·성취도 실시간 대시보드 운영 중	기보유
질의응답 게시판·학습자 소통	Q&A 게시판 및 실시간 채팅 커뮤니티 운영 중	기보유
사업 기간 내 상시 운영·유지보수	자체 개발팀이 직접 운영하여 외부 벤더 경유 없이 즉시 대응, 서버·데이터 정기 백업, 개인정보 보호 조치 적용	자체 수행

- (즉시가동) 계약 직후 본 사업 전용 클래스를 개설하여 **교육 개시일 이전에 플랫폼 준비를 완료**함. 구축 기간이 필요 없으므로 일정 지연 리스크가 발생하지 않음
- (자동집계) 만족도·성취도 설문을 플랫폼에서 자동 발송·집계하여, 과업 성과물 ‘만족도 조사 1식’의 근거 데이터를 상시 축적함
- (데이터이관) 사업 종료 시 학습 데이터·산출물 일체를 정리하여 발주처에 이관하고, 이관 완료 후 보유 데이터를 파기함

1.7 [과업 ⑥] 교육용 AI 계정 제공 (1,740명, 1인 1계정)

요구 요건	충족 방안
미성년자 사용 가능	미성년자 이용을 약관상 허용하는 서비스로 선정하고, 보호자 동의 절차를 거쳐 발급함(예: ChatGPT는 보호자 동의, Gemini for Education은 관리자 통제)
Pro급 이상 교사양 모델 (바이브 코딩 앱 빌드 가능)	교사양 앱 빌드가 가능한 Pro급 이상 요금제로 구성하여 사용량 제한 없이 실습을 보장함
엔터프라이즈급 보안 인증	인증 보유 서비스로 한정함(예: OpenAI는 SOC 2 Type II·ISO/IEC 27001·42001, Google은 SOC 1/2/3·ISO/IEC 27001·27701 등)
1인 1계정 샌드박스 제공 및 유지	교육용 워크스페이스를 격리 구성하고, LMS 계정과 1:1 매핑하여 발급·회수·이용 현황을 단일 대장으로 관리함

- (제공 규모) 과업지시서 요구인 1,560명(강사 120 + 학생 1,200 + 성인 240)에 더하여, 챌린지에만 참여하는 도민 180명분을 **자체 부담으로 추가 제공**하여 **총 1,740계정**을 발급함
- (미성년 보호) 유해 프롬프트 필터링 정책을 적용하고, 교육 개시 전 안전한 AI 사용 규칙 오리엔테이션을 실시함
- (계정관리) 사업 기간 내 계정을 유지하며, 종료 시 일괄 회수 및 데이터 파기 절차를 수행하고 그 결과를 최종보고서에 첨부함
- (발주처 승인) 최종 서비스 선정은 착수보고 시 요건 충족 근거(약관·인증서·요금제)를 제출하고 발주처 승인을 받아 확정하며, 자체 랩핑 없이 **정식 계정을 직접 발급**함

2. 사업관리계획

2.1 추진 일정 (계약일 ~ 2026. 12. 18.)

과업 내용	8월	9월	10월	11월	12월
보고회	착수 (10일 내)	중간 (3개월 내)	-	-	최종 (만료 10일 전)
④ 교육과정·교재·VOD 개발	집중 개발	집중 개발	보완	보완	최종본
⑤ 온라인 플랫폼	즉시 가동	상시 운영	상시 운영	상시 운영	이관·정리
⑥ AI 계정 1,740개	요건 승인 발급 개시	운영	운영	운영	회수·파기
① 강사 모집·공통 128h	모집·선발	공통과정 운영	공통과정 운영	-	-
① 전문 심화 32h·인증 평가	-	-	심화과정 운영	심화·인증 평가	자격 지원
② 학생 1,200명·학부모 240명	수요조사	교육 운영	교육 운영	교육 운영	교육 운영
③ 바이브 코딩 챌린지	기획·훈격 협의 착수	규정 정비	준비	홍보·접수	본행사·시상
결과 정리·성과물 제출	-	-	-	초안 작성	최종 제출

- **(착수)** 계약일로부터 7일 이내 과업수행계획서(수행 방향·세부계획·책임연구자 이력서·인력투입계획서·예산소요경비 내역서·보안각서 및 보안대책 포함)를 제출하고, 10일 이내 현장대리인 선정·착수계·예정공정표 제출 및 착수보고회를 개최함
- **(주간보고)** 사업기간 내 **매주 수요일 17시까지** 일주일간의 사업경과를 서면 또는 이메일로 보고하며, 플랫폼 대시보드 링크를 첨부하여 실시간 확인이 가능하도록 함
- **(중간·최종)** 2026년 9월 내 과업 전체 1차 초안을 중간보고하고(계약 후 3개월 이내 보고회), 계약만료 10일 이전 최종보고회를 개최함. 최종보고서 초안은 보고회 1주일 전까지 제출하여 감독관 검토를 받음
- **(사전승인)** 착수보고서 내용 변경, 주요 과업내용 변경, 관계기관 협의사항은 사전에 발주기관 승인을 받은 후 진행하고 완료 후 서면 보고함

2.2 일정관리 및 의사소통 체계

가. 일정관리 방법

- **(WBS 관리)** 과업 ①~⑥을 작업분류체계(WBS)로 분해하여 세부 작업 단위의 주간 진척률을 관리하고, 예정공정표 대비 실적을 매주 비교하여 주간 공정보고에 명시함
- **(만회대책)** 지연 징후 발견 시 임계경로를 분석하여 **만회 대책(강사 추가 투입·거점형 병행 편성·주말 보강)**을 수립하고, 발주처에 지연 사유·만회 계획·완료 예정일을 함께

보고함

- **(선행관리)** 모집·교육·행사 등 선행행 관계가 있는 과업은 선행 과업의 완료 기준을 명확히 정의하여, 후속 일정이 연쇄 지연되지 않도록 관리함

나. 의사소통 및 보고 체계

구분	주기·시점	내용
주간 공정보고	매주 수요일 17시 까지	일주일간 사업경과를 서면·이메일로 보고, 실시간 대시보드 링크 첨부
월간 정례회의	월 1회 (발주처 협의)	진척·이슈·차월 계획 대면 협의, 회의록 작성·공유
수시 협의	사안 발생 시	착수보고서 내용 변경, 주요 과업내용 변경, 관계기관 협의사항 등 사전승인 대상은 반드시 승인 후 진행하고 완료 후 서면 보고
자문위원회	발주처 협의 시	발주처가 자문위원회를 구성·운영하는 경우 안건 자료 작성·발표 등 운영을 지원하고, 자문 결과를 과업 수행에 최대한 반영함
보고회	착수·중간·최종	착수(10일 이내)·중간(3개월 이내)·최종(만료 10일 전) 보고회 개최

다. 변경관리

- 부득이한 사유로 당초 계획 수행이 어려운 경우 발주기관과 협의하고, 타당성이 인정되는 범위에서 과업내용·기간을 조정함. 모든 변경 사항은 서면으로 기록·관리하며, 변경 이력을 최종보고서에 첨부함
- 보고·통지·요청·이의제기는 서면으로 하며, 주요 협의 내용은 문서로 기록·비치하여 발주기관 요구 시 즉시 제출함

2.3 품질 및 성과 관리

관리 항목	관리 방법	목표
KPI 진척 관리	강사 120명 / 학생 1,200명·1인 1앱 / 학부모 240명 / 챌린지 300명 / VOD 강의 30개 / 계정 1,740개를 주간 대시보드로 목표 대비 진척 관리	전 항목 100% 달성
모집 리스크	목표 대비 200% 지원자 확보·150% 선발 파이프라인 구축, 권역별 예비 수요처(학교·기관) 사전 확보, 미달 시 2차 모집·거점 추가 즉시 실행	각 과정 정원 충족
수업 품질	시니어 강사 QA 순회 점검, 회차별 만족도 조사(5점 척도) 실시, 4.0 미만 회차는 원인 분석 후 즉시 개선 조치 및 발주처 보고	만족도 4.5 이상
강사 역량 관리	역량 체크리스트 기반 회차별 도달도 평가, 미도달자 보충 지도 및 재평가	수료 기준 100% 충족
만족도 조사	교육별 사전·사후 조사를 플랫폼에서 자동 집계하여 성과 분석 보고서 작성	전 과정 조사 실시

☐ 만족도 조사 설계(안)

대상	시점·방법	주요 문항 구성
강사 양성 과정	회차별 + 수료 시 (플랫폼 자동 발송)	교육 내용·강사·운영·시설 만족도(5점 척도), 현장 적용 의향, 개선 의견(주관식)
학생 정규 과정	과정 종료 시 (현장 QR 응답)	흥미·이해도·산출물 성취감·재참여 의향, 학년군별로 문항 표현을 조정함
학부모 교육	회차 종료 시 (현장·모바일 병행)	유익성·이해도·가정 내 활용 의향, 추가 희망 주제
챌린지	행사 종료 시	행사 운영·프로그램 만족도, 차년도 참여 의향

※ 사전·사후 비교가 가능하도록 문항을 설계하고, 조사 결과를 성과 분석과 함께 과업 성과물 ‘만족도 조사 자료 1식’으로 제출함

2.4 성과물 제출 관리

성과물	제출 시기	부수	비고
착수보고서	계약 후 10일 이내	5부(A4)	과업착수 보고
중간보고서	계약 후 3개월 이내	5부(A4)	과업 전체 1차 초안
최종보고서	계약만료 10일 전	10부(A4)	전산파일(USB) 1개 동봉
온·오프라인 교육 자료	계약만료 10일 전	1식	이론·실습 가이드, 개발 지침서, 온라인 학습자료
교육 프로그램 운영 자료	계약만료 10일 전	1식	참여자 명단, 만족도 조사 결과, 성과 분석
AI 교육 행사 자료	계약만료 10일 전	1식	규정집, 심사자료, 홍보물, 사진/영상
만족도 조사 자료	계약만료 10일 전	1식	각 교육별 만족도 조사 결과

※ 보고서 작성에 활용된 모든 조사·분석 자료를 전자파일(xls·hwp 등) 형태로 USB에 담아 함께 제출함. 성과물의 지적소유권 및 2차적 저작물 작성권은 발주자와 공동 소유하며, 수집·생산 자료는 본 과업 외 용도로 사용하지 않음

2.5 보안 및 개인정보 보호

□ 사업기간 전·중·후 보안체계 및 대책

착수 전	보안대책을 수립하여 과업수행계획서에 포함하고, 착수계와 함께 수급인 보안각서 및 용역참여자 전원의 보안각서(자필 서명) 를 제출함. 학생 교육 배치 예정 강사 전원의 성범죄·아동학대 전력 조회 동의서를 모집 단계에서 징구함
수행 중	전력 조회 완료 강사만 학생 교육에 배치 함. 개인정보 수집 항목 최소화·보호자 동의 징구, 플랫폼 내 암호화 저장·접근 권한 분리, 자료 반출 통제를 적용하고, 참여자 교체 시 보안각서·인계인수를 동일하게 이행함. 「중대재해처벌법」상 안전·보건 의무를 준수하며 현장 교육·행사 시 안전관리 담당자를 지정함
종료 후	AI 계정 일괄 회수·권한 말소, 학습 데이터·산출물 일체를 발주처에 이관한 후 보유분을 파기하고, 파기 결과를 최종보고서에 첨부 함

2.6 위험관리

위험 요인	등급	대응 방안
강사 양성 과정 모집 미달	중	도내 대학·교원단체·수료생 커뮤니티 다채널 홍보로 목표 대비 200% 지원자 확보·150% 선발 파이프라인 확보, 미달 시 2차 모집 즉시 개시
학생 1,200명 목표 미달	중	학교 방문형 수요조사를 착수 즉시 착수하고, 거점형 과정을 병행 편성하여 결원을 흡수
학교 실습 환경 제약 (네트워크·PC 사양)	상	고사양 자체 노트북 반입 및 자체 라우터 격리망 구성으로 학교 환경에 의존하지 않는 실습 체계 운영
AI 서비스 정책 변경 (요금·연령 정책)	중	요건(미성년자 이용·Pro급·보안 인증)을 충족하는 대체 서비스를 사전 검토하여 후보군을 확보하고, 변경 시 발주처 승인 후 전환
참여인력 유고	하	동등 이상 자격의 예비 인력을 상시 확보하고, 교체 시 사유를 명기하여 발주기관 사전승인을 받음
챌린지 훈격 확보 지연	중	착수 단계에서 협의를 개시하고, 확보 지연 시 기관장상 우선 확정 후 상위 훈격을 병행 추진
태풍 등 기상 악화 (방문형 교육 중단)	중	권역별 예비일을 사전 편성하고, 기상특보 발효 시 실시간 온라인 강의로 전환 후 오프라인 보강 수업을 병행하여 총 교육 시수를 보전함
감염병 등 대면 교육 제한	하	전 과정을 LMS 기반 온라인 전환 운영이 가능하도록 설계하여, 대면 제한 상황에서도 교육 중단 없이 진행함

2.7 산출물 검수 및 예산 집행 관리

가. 산출물 검수 절차

내부 검수 (PM·QA 체크리스트)	발주처 제출·검토	검토 의견 반영 보완·재제출	승인·확정
------------------------	-----------	--------------------	-------

- **(검수기준)** 교재·VOD·보고서 등 모든 산출물은 내용 정확성·오탈자·미성년자 대상 표현 적합성·개인정보 노출 여부를 내부 체크리스트로 검수한 후 발주처에 제출하고, 검토 의견을 반영하여 승인 후 확정함
- **(버전관리)** 산출물별 버전과 변경 이력을 관리하여 최종본 혼선을 방지하고, 확정본 일체를 전산파일(USB)로 정리하여 제출함


나. 예산 집행 관리

- **(투명집행)** 예산을 과업 항목별로 배정·관리하고, 집행 내역과 증빙을 정리·보관하여 발주처 요구 시 즉시 제출함
- **(변경협의)** 과업 항목 간 예산 조정이 필요한 경우 사전에 발주기관과 협의한 후 집행함

- (규정준수) 대가 청구 시 청구금액의 2.5%에 해당하는 제주특별자치도 지역개발공채 매입 등 제안요청서에 명시된 행정 절차를 준수함

3. 인력운영계획

3.1 사업 수행 조직 및 업무분장

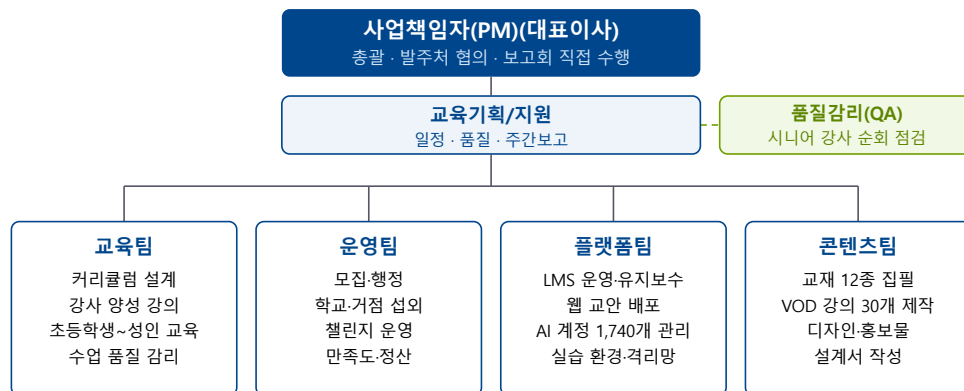

[그림 Ⅲ-3] 본 사업 수행 조직도 (분야별 책임자 명시, 서식8 연계)

3.2 투입인력 및 역할 분담

역할	인원	주요 담당 업무
사업책임자(PM)	1명	사업 총괄, 발주처 협의·보고회 직접 수행, 제안설명, 최종 의사결정
교육기획/지원	1명	추진 일정·품질 총괄, 주간 공정보고, 교육과정 설계서 작성, 성과물 체크리스트 관리
교육팀 (수석·책임·선임)	10명	강사 양성 공통·심화 과정 강의, 초등학생~성인 교육 주강, 마이크로 티칭 평가, 수업 품질 감리
운영팀	6명	모집·선발 행정, 학교·권역 거점 섭외, 챌린지 기획·운영, 만족도 조사, 정산
플랫폼·콘텐츠팀	6명	LMS 상시 운영·유지보수, 웹 교안 배포, AI 계정 발급·회수, 교재 집필·VOD 제작

※ 상근 정규직 30명 중 24명을 본 사업에 투입하며, 개인별 투입률은 참여기술자 확인서(서식7)로 같음
하고 개인별 이력사항은 서식9로 제출함

3.3 월별 인력 투입 계획

역할	8월	9월	10월	11월	12월
사업책임자(PM)	착수보고 총괄 지휘	중간보고	총괄 지휘	총괄 지휘	챌린지· 최종보고

역할	8월	9월	10월	11월	12월
교육기획/지원	설계서 작성 WBS 수립	일정·품질 관리	일정·품질 관리	성과물 초안	성과물 제출
교육팀	커리큘럼 확정	강사 양성 강의	강사 양성· 학생 교육	학생·학부모 교육	교육 마무리 챌린지 심사
운영팀	모집·수요 조사	모집·학교 섭외	교육 운영 행정	챌린지 홍보·접수	챌린지 운영 정산
플랫폼·콘텐츠 팀	클래스 개설 계정 발급	교재·VOD 제작	VOD 완성 플랫폼 운영	플랫폼 운영	데이터 이관 계정 회수

※ 전 역할이 사업 기간 내 상시 투입되며, 위 표는 월별 핵심 업무를 표시한 것임

3.4 양성 강사 활용 및 배치 체계 **필수 요구**

배치 역할	배치 대상	담당 업무
주강사	전문 트랙·전년도 수료 강사	학생 정규과정 수업·바이브 코딩 실습 지도
보조강사	초급 트랙 수료 강사	실습 보조·질의 대응, 주강사와 페어링
품질 감리 (QA)	제안사 수석·책임강사	회차별 순회 점검과 강사 역량 보완 지도
대체 투입 (무공백 백업)	제안사 임직원 강사진(상근 정규 직)	양성 강사 배정 불가 일정의 강의 직접 수행

□ 단계적 강사 투입 로드맵: 양성 일정과 학생 교육 일정의 선후행 정합

9~10월	제안사 전문 강사진과 전년도 수료 강사 를 주강으로 투입하여 학생 교육을 개시함(초기 품질 담보)
11월	금년 초급 트랙 수료 강사 를 보조강사로 페어링 투입 하여 현장 경험을 축적함
11~12월	금년 전문 심화 수료 강사 를 주강으로 확대 배치 하고, 챌린지 멘토·심사 보조로 참여 시킴

※ 강사 양성과 학생 교육 일정의 선후행을 고려하여 후반부로 갈수록 지역 강사 투입 비중을 확대함

- **(배치절차)** 수료·인증 평가 → 인력풀 DB 등록 → 권역·학교 매칭 → 교안 리허설 → 투입 → 평가·피드백
- **(권역매칭)** 강사를 거주 권역과 가까운 학교·거점에 우선 배치함
- **(무공백 운영)** **양성 강사 배정이 불가한 일정에는 제안사 임직원이 직접 강의**하며, **주강-보조-임직원 3중 배치안**을 사전 확정하여 **결강이 없음**
- **(사후이관)** 인력풀 DB와 파견 요청·배정·정산 절차서를 발주처에 이관하여 상시 활용 기반을 마련함

3.5 인력 운영 원칙

- **(변경불가)** 낙찰 후 참여인력을 임의 변경하지 않으며, 부득이한 경우 발주기관 사전 승인 후 동등 이상 자격자로 교체함(인계인수·보안각서 이행)

- (직접수행) 공동수급체 구성·하도급 없이 전 과업을 자체 인력으로 직접 수행함
- (증빙) 투입인력 전원의 재직·경력증명서·4대보험 가입자명부를 심사기준일 이전 발급분으로 제출함

1. 무상 부가 제안

아래 항목은 제안 예산과 무관하게 추가 비용 없이 제공함

추가 제안	내용 및 기대효과
① 전자책 17종·VOD 강의 30개 무상 제공	자체 출판 도서 17종(Ⅱ-2.3)과 자체 제작 대상별 VOD 강의 30개(300여 개 영상)를 참여자 1,740명 전원에게 무상 제공하여 자기주도 학습을 지원함
② 웹 실습 환경 무상 제공	초등 트랙용 웹 기반 코딩 실습 환경을 무상 제공하여 저사양 PC에서도 실습을 지원함
③ 제주 AI 컨퍼런스(300명) 연계 개최	제안사가 매년 직접 기획·운영해 온 제주 AI 컨퍼런스(300명 규모)를 챌린지와 연계 개최하여, 수료생 산출물의 발표 무대와 도내 개발자·기업과의 네트워킹 기회를 추가 비용 없이 제공함
④ 수료 후 커뮤니티 상시 운영	수료생 온라인 커뮤니티를 사업 종료 후에도 유지함
⑤ 교재 도민 공개	발주처 협의 하에 청소년용·학부모용 교재 일부를 웹에 공개하여 일반 도민의 자기주도 학습을 지원함

2. 사업 연속성 지원

- (차년도 연계) 금년 수료 전문강사가 차년도 ‘전문강사 양성’ 자격요건(전년도 수료자)에 연결되도록 수료 체계·이수 기록을 표준화하여 발주처에 이관함
- (지역자산화) 교육과정 설계서·교재 12종·VOD·강사 인력풀 DB·산출물 아카이브를 패키지로 제출하여 도내 학교·기관이 재활용하도록 함
- (파견체계) 강사 파견 요청·배정·정산 표준 절차를 작성하여 발주처가 인력풀을 상시 운용할 기반을 남김

3. 영문 약어표

AI 인공지능 · LMS 학습관리시스템 · VOD 주문형 동영상 강의 · LLM 대규모 언어 모델 · API 응용 프로그램 연동 인터페이스 · ML/DL 머신러닝/딥러닝 · DB 데이터베이스 · KPI 핵심 성과 지표 · PM 사업 관리 책임자 · QA 품질 관리 · WBS 작업분류체계 · CAIO 인공지능 최고 책임자 · UI/UX 사용자 화면/경험 · SOC 2·ISO/IEC 27001 정보 보호 국제 인증 · ICT 정보통신기술 · DX 디지털 전환 · KDT 디지털 핵심 실무인재 양성훈련 · RAG 검색 증강 생성

이행 확약

본 제안서의 모든 수치와 수행 방안은 객관적으로 입증 가능하며, 계약조건의 일부로 이행함을 확약하고 요구 시 증빙자료를 즉시 제시함
